

Obra: Ruta RN. 0011 / RN. A009

Tramo: INGRESO A CALCHAQUÍ - EMP. RP N° 31 (AVELLANEDA);

Secciones: Km 665 - Km 794,69

INFORME: AGOSTO 2025.

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
7º DISTRITO SANTA FE

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV

En cumplimiento a lo impuesto en el punto 3 de la Resolución dictada por SS Juez de 1° Instancia, Dr. Aldo Mario Urralde, en autos caratulados “SCARPIN, DIONISIO FERNANDO CONTRA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD S/ AMPARO” (Expediente N° FRE 4885/24) del 10 de marzo de 2025, se emite el presente informe por parte de esta Repartición, respecto de la Ruta Nacional N° 11, entre las progresivas (aproximadas) 665 y 930, describiendo los trabajos realizados en el mes de julio de 2025.

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realiza la conservación de todo el tramo por medio de dos contratos bien diferenciados, el primero que inicia en la progresiva 618,45, pasa por la ciudad de Calchaquí, Km 665, y finaliza en el Km. 794,69; el segundo contrato comienza en el Km 794.69, pasa por el límite de las provincias Santa Fe y Chaco, Km. 930, y finaliza en la ciudad de Resistencia.

Las obras mencionadas en el párrafo anterior fueron contratadas bajo dos modalidades de obra, con tareas similares y un mismo objetivo, administrados por diferentes Distritos, el primero por el 7° Distrito Santa Fe y el segundo por el 18° Distrito Chaco.

A continuación, se informa acerca del primero de los tramos mencionados:

Tramo descripto: Km 665 – Km 794.69

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Obra: Ruta RN. 0011 / RN. A009

Tramo: EMP. RP N° 39 (CRESPO) - EMP. RP N° 31 (AVELLANEDA); PUERTO RECONQUISTA - EMP. R.N. N° 11.

Sección: Ruta Nacional N° 11: Km 618,45 - Km 794,69; Ruta Nacional A009: Km 0,00 - Km 11,89

Contratista: COINGSA S.A.

Inicio: 28/04/2023

Finalización de acuerdo a Nuevo Plan de Trabajos: 28/12/2025.

Plazo de garantía: seis meses.

Descripción:

Esta obra mejorativa y de mantenimiento bajo el sistema Modular licitada bajo el Proceso 46-0297-LPU21, es ejecutada por la empresa COINGSA.

Los trabajos previstos contemplan fundamentalmente mejorar la transitabilidad y seguridad del usuario de la vía efectuando tareas de rehabilitación de calzada y mantenimiento en zona de camino en una longitud a intervenir de 188.73 Km.

Esta modalidad contractual (sistema Modular), tiene como particularidad la detección, medición y reparación integral de fallas en la carpeta de rodamiento (baches), que se encuentran dispersos en forma heterogénea en el espacio y en el tiempo, a trabajarse durante la duración del contrato (dos años). Similar criterio se aplica a otras tareas que involucra el contrato, como reparación de banquetas, corte de pasto (manual y con máquinas), mantenimiento de alcantarillas, barandas metálicas de defensa y desagües, limpieza general permanente de obra.


Cabe aclarar que no contempla la repavimentación integral del tramo.

En pavimento flexible, carpeta de asfalto, se prevé bacheo superficial con concreto asfáltico, espesor promedio 0,10 m, bacheo profundo con concreto asfáltico, reciclado con suelo cemento más carpeta asfáltica, en un espesor total de 0.30 m. promedio, previo fresado del pavimento existente en espesor 0,05 m.

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV

En pavimento rígido de hormigón, se prevé la ejecución de tareas de resellado de juntas y fisuras en losas de hormigón; aserrado, demolición, extracción y posterior reconstrucción de losas de hormigón en mal estado.

En el mapa siguiente se resalta en colorado el tramo de ruta al que se refiere el presente informe, en todas sus fotografías y progresivas detalladas.

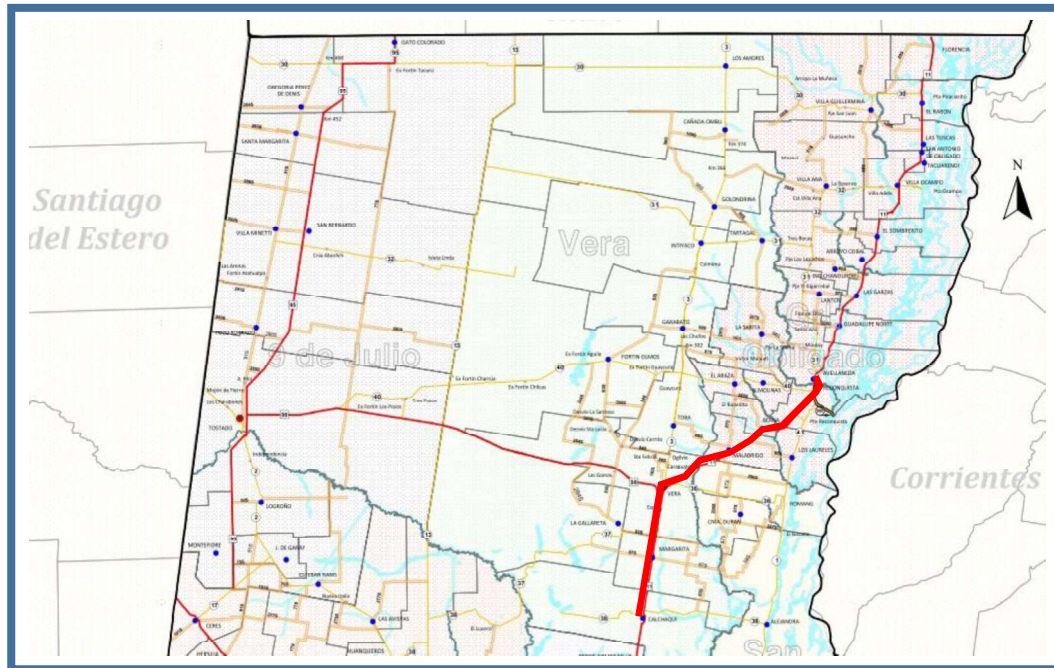

A continuación, se realiza un resumen de las tareas realizadas:

Mes: agosto de 2025.

Tarea: CORTE DE PASTOS Y MALEZAS en ambos lados de la calzada, en un ancho de 14 metros, discontinuos.



Desde Km. 675 a Km. 744. -

Tarea: LIMPIEZA GENERAL DEL TRAMO en ambos lados de la calzada, en un ancho de 25 metros, discontinuos.



Desde Km. 618.50 a Km 705.85.

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV


Tarea: BACHEO SUPERFICIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, en 0.10 m. de espesor, a ambos lados.



Desde Km. 618.50 a Km. 753.00

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV

Tarea: BACHEO PROFUNDO CON SUELO CEMENTO.

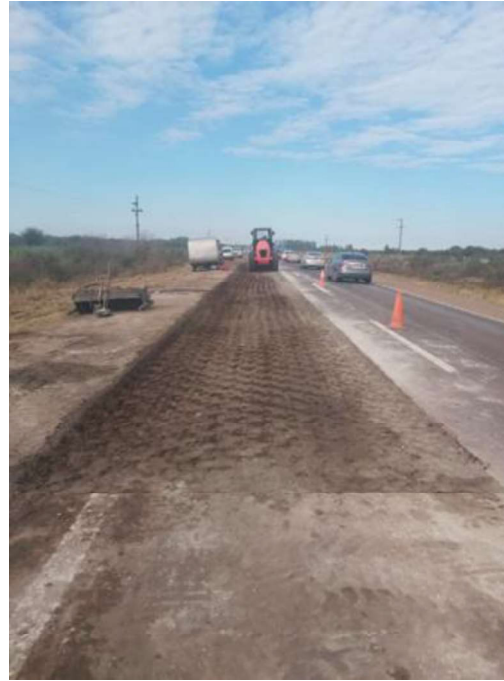


Desde Km. 618.50 a Km. 706.00

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV

Página 6 de 9


Tarea: SELLADO DE FISURAS TIPO PUENTE.

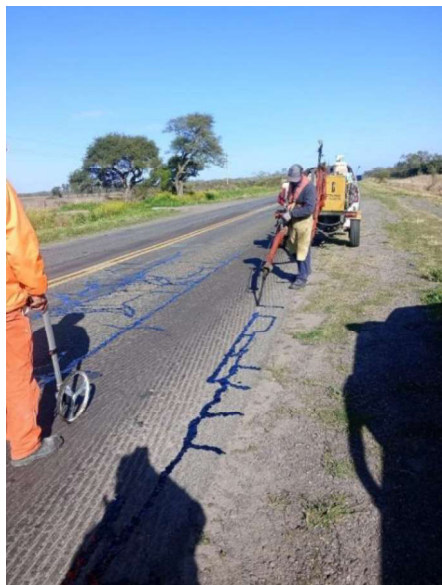

Desde Km. 732.3 a Km. 741.

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV

Tarea: FRESADO DE CRESTAS Y DEFORMACIONES.

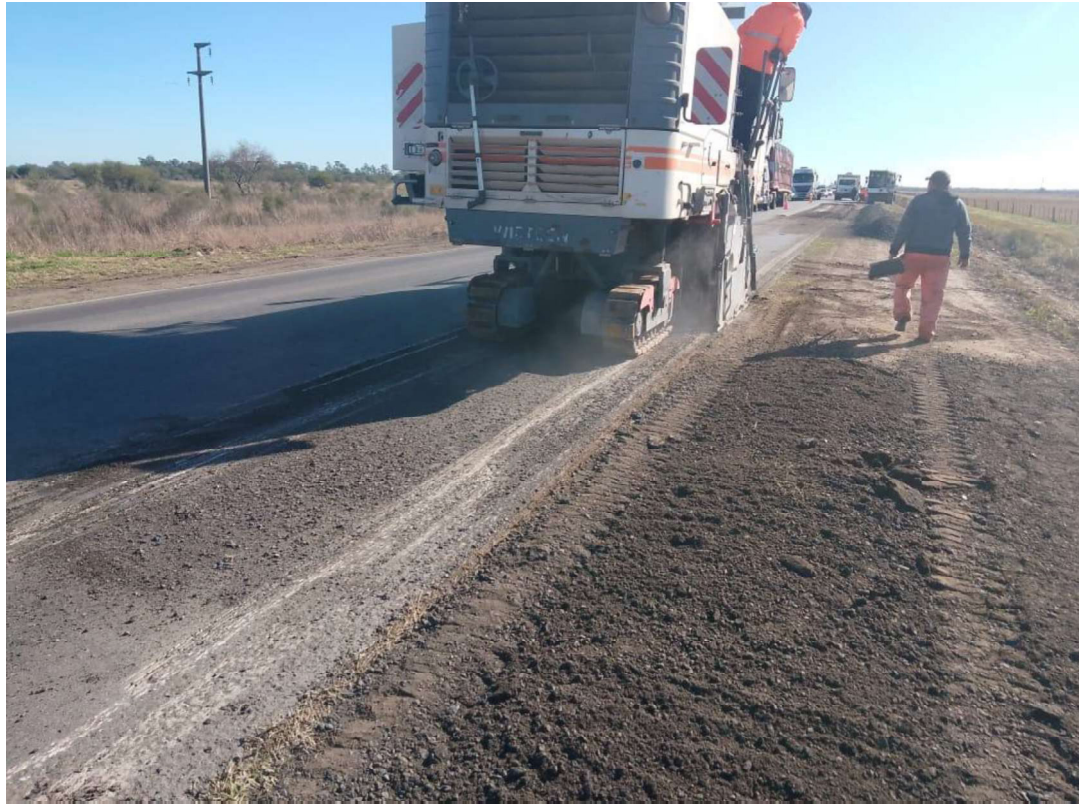

Desde Km. 697.90 a Km. 700.90.

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV

Tarea: MANTENIMIENTO DE BANQUINAS Y TALUDES. Ambos lados. Discontinuo



Desde Km. 619.15 a Km 771.

IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV

SANTA FE, SANTA FE
Martes 9 de Septiembre de 2025

Referencia: INFORME TECNICO AGOSTO 2025, OBRA MEJORATIVA Y DE MANTENIMIENTO SISTEMA MODULAR RN N 11 Y RN N A009, Tramo: INGRESO A CALCHAQUÍ - EMP. RP N° 31 (AVELLANEDA); Secciones: Km 665 - Km 794,69

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.09 12:39:42 -03:00

Jorge Oscar Zabalegui
Supervisor de Obra
Distrito de Santa Fe
Dirección Nacional de Vialidad

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.09 13:31:57 -03:00

Pablo Martín Etchevest
Jefe de División
Distrito de Santa Fe
Dirección Nacional de Vialidad

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.09 13:31:58 -03:00



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Jueves, 14 de agosto de 2025

Calado de testigos en sección 8 - Calce de banquina entre Km 919,000 a 920,000 LD y LI.





Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Viernes, 15 de agosto de 2025

Calce de banquina entre Km 921,000 a Km 920,000 LD y LI.





Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Sábado, 16 de agosto de 2025

Reposición y reparación de señales verticales en tramo.





Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Lunes, 18 de agosto de 2025

Colocación de señalamiento vertical.



Martes, 19 de agosto de 2025

Sin actividad por lluvias.



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Colocación de señalamiento vertical.



Jueves, 21 de agosto de 2025

Bacheo de emergencia con mezcla en caliente en zonas varias.



IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNY
Página 18 | 23



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Viernes, 22 de agosto de 2025

Perfilado de banquetas en zonas varias.



Sábado, 23 de agosto de 2025

Estabilización de banquetas con material de fresado en zonas varias.



IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNY
Página 19 | 23



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Lunes, 25 de agosto de 2025

Estabilización de banquetas con material de fresado Km 923+800 a Km 924+800 LD y LI.





**Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte**

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Martes, 26 de agosto de 2025

Estabilización de banquetas con material de fresado entre Km 925,800 a Km 924,800 LD y entre Km 924,800 y Km 925,800 LI. Tapado depresiones banquetas Km 994,000 y Km 960,000.



Miércoles, 27 de agosto de 2025

Sin actividad en tramo.



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Jueves, 28 de agosto de 2025

Colocación de señalamiento vertical.



Viernes, 29 de agosto de 2025

Colocación de señalamiento vertical y estabilización de banquetas con material de fresado en Km 960,000.






Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Sábado, 30 de agosto de 2025

Colocación de señalamiento vertical y estabilización de banquetas con material de fresado en Km 989,000; Km 955,000 y Km 953,200.

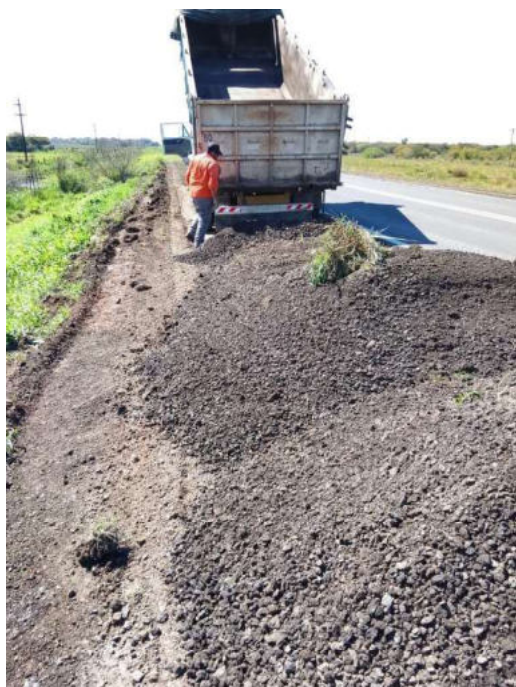



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNV

RESISTENCIA, CHACO
Miércoles 3 de Septiembre de 2025

Referencia: INFORME N°4 MES AGOSTO/25. OBRA: MALLA RN11D. TRAMO: EMP. RUTA PROVINCIAL N°31 (PROV. DE SANTA FE) - ACC. CEMENTERIO PARQUE JAZMÍN (PROV. DEL CHACO).
CONTRATISTA: ICF S.A. EXPTE. PPAL. N°4019/2020.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.03 13:20:18 -03:00

Pedro Nelson Veliz
Inspector de Obra
Distrito de Chaco
Dirección Nacional de Vialidad

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.03 13:20:19 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Nota

Número: NO-2025-98687758-APN-DCHA#DNV

RESISTENCIA, CHACO
Viernes 5 de Septiembre de 2025

Referencia: INFORME N°4 MES AGOSTO/2025 - Pedido de Informe para causa “SCARPIN, DIONISIO FERNANDO Y OTRO S/ AMPARO” (Expte. N° 4885/2024).

A: Daniel Raúl Romagnoli (DSF#DNV),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Se remite embebido Nota de la Inspección NO-2025-97749383-APN-DCHA#DNV, mediante archivo embebido IF-2025 97744800-APN-DCHA#DNV, el Informe mensual del mes de agosto/2025, correspondiente al asunto del epígrafe.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.05 10:57:01 -03:00

E/E German Eduardo Villalba
Jefe de División
Distrito de Chaco
Dirección Nacional de Vialidad

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.05 10:57:04 -03:00



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina



ID: 4426

EXPTE PRINCIPAL: EX-2021-84239638-APN-LYC#DNV

OBRA: MALLA RN11D.

TRAMO: EMP. RUTA PROVINCIAL N°31 (PROV. DE SANTA FE) – ACC. CEMENTERIO PARQUE JAZMÍN (PROV. DEL CHACO).

SECCIONES: VARIAS

CONTRATISTA: ICF S.A.

TAREAS PR1 Y PR2

AGOSTO 2025

IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNV
Página 1 | 23



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte


2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

SISTEMA DE GESTIÓN CONTRATO RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OBRA CREMA
ADMINISTRADA POR DISTRITO CHACO
Tramo descripto Km 794.69 - Km 930.00

En cumplimiento a lo impuesto en el punto 3 de la Resolución dictada por SS Juez de 1° Instancia, Dr. Aldo Mario Urralde, en autos caratulados “SCARPIN, DIONISIO FERNANDO CONTRA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD S/ AMPARO” (Expediente N° FRE 4885/24) del 10 de marzo de 2025, se emite el presente informe por parte de esta Repartición, respecto de la Ruta Nacional N° 11.

A continuación, se describe el estado de la vía y las tareas que se realizan en el segundo tramo, administrado desde la provincia del Chaco.

TRAMO II

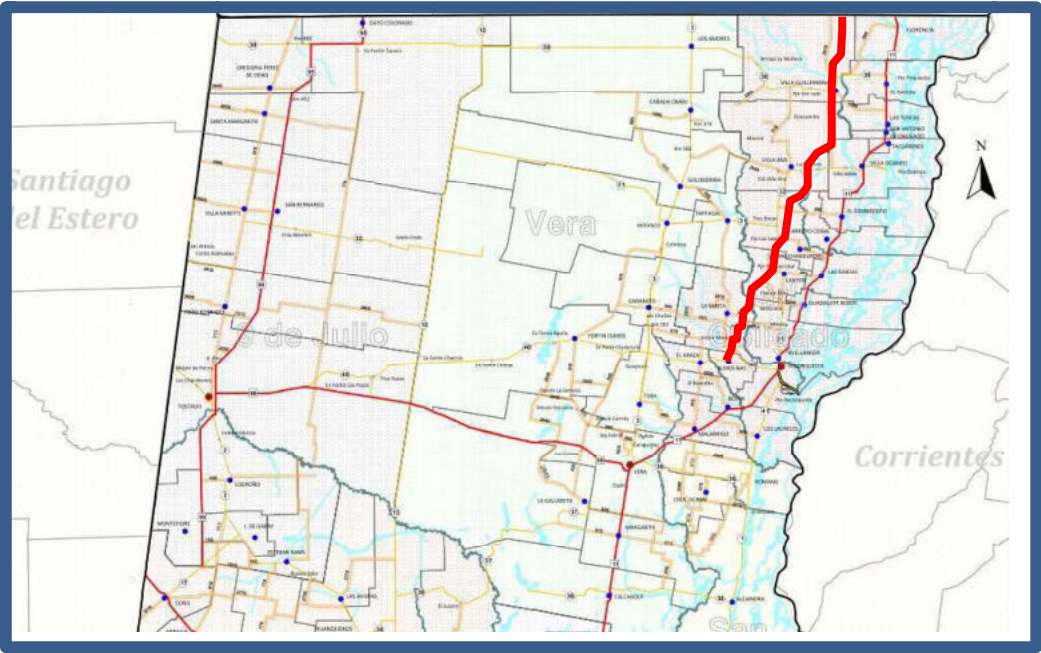



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

Obra: Ruta RN. 0011 (MALLA RN11D).

Tramo: Empalme R.P. N° 31 (Provincia de SANTA FE) – Acceso Cementerio Parque Jazmín (Provincia del Chaco).

Sección: Empalme R.P. N° 31 (Km. 794,69) – Acceso Cementerio Parque Jazmín (Km. 1.000,11).

Contratista: I.C.F. S.A.

Inicio: 09/01/2023.

Finalización de acuerdo a Plan de Trabajos: 09/01/2029.

Plazo de obra vigente :72 meses.

Descripción:

Esta obra de Recuperación y Mantenimiento bajo el Sistema de Gestión C.Re.Ma., licitada mediante el Proceso 46-0185-LPU21, es ejecutada por la empresa I.C.F. S.A. Dicha modalidad contractual prevé la conservación integral de la ruta, durante todo el plazo contractual, seis años, realizando tareas de mantenimiento y reparación localizadas (bacheos superficiales y profundos, sellados de fisuras) y generalizadas, como también prevé la **repavimentación en distintas secciones del tramo**.

Descripción del tramo, su estado y tareas que se realizan:

El estado general de tramo es de regular a bueno, en toda su longitud, con ahuellamientos, fisuras, pero con escasa aparición de baches. Los baches constatados no poseen desprendimientos.

El señalamiento horizontal (pintura central y lateral) se encuentra en buen estado de conservación.

Además, posee iluminación en todas las travesías urbanas, por lo que se puede transitar en todo su recorrido con seguridad.

La empresa contratista realiza tareas de corte de pasto, señalamiento horizontal provisorio, de emergencia, fundamentalmente en curvas y eje.



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

TAREAS REALIZADAS EN MES DE AGOSTO/2025

Viernes, 1 de agosto de 2025

Carpeta asf. desde Km 918,600 a Km917,850.





Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Sábado, 2 de agosto de 2025
Carpeta asf. desde Km 918,650 a Km 917,800.





Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Domingo, 3 de agosto de 2025

Carpeta asf. desde Km 917,800 a Km 917,005.



Lunes, 4 de agosto de 2025

Carpeta asf. desde Km 917,005 a Km 916,230.





Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Martes, 5 de agosto de 2025

Bacheo sup. desde Km 916,650 a Km 917,650 LD - Carpeta asf. desde Km 917,850 a Km 917,295.



Miércoles, 6 de agosto de 2025

Carpeta asf. desde Km 917,295 a Km 916,605.



IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNY
Página 7 | 23



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Jueves, 7 de agosto de 2025

Sin actividad por lluvia.

Viernes, 8 de agosto de 2025

Carpeta asf. desde Km 916,230 a Km 916,040 LI; y desde Km 916,605 a Km 916,220 LD.



IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNY
Página 8 | 23




Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Sábado, 9 de agosto de 2025

Bacheo desde Km 916,030 a Km 915,400 ambos lados – Carpeta asf. desde Km 916,040 a Km 915,765 LI.

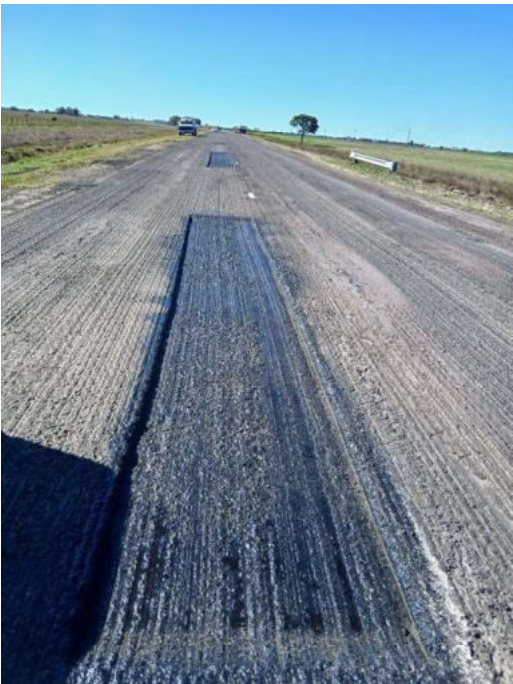



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Domingo, 10 de agosto de 2025

Bacheo desde Km 916,200 a Km 915,350; Carpeta asf. desde Km 916,220 a Km 915,625 LD



IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNY
Página 10 | 23




Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Lunes, 11 de agosto de 2025

Carpeta asf. desde Km 915,625 a Km 915,150 LD; y desde Km 915,765 a Km 915,315 LI.

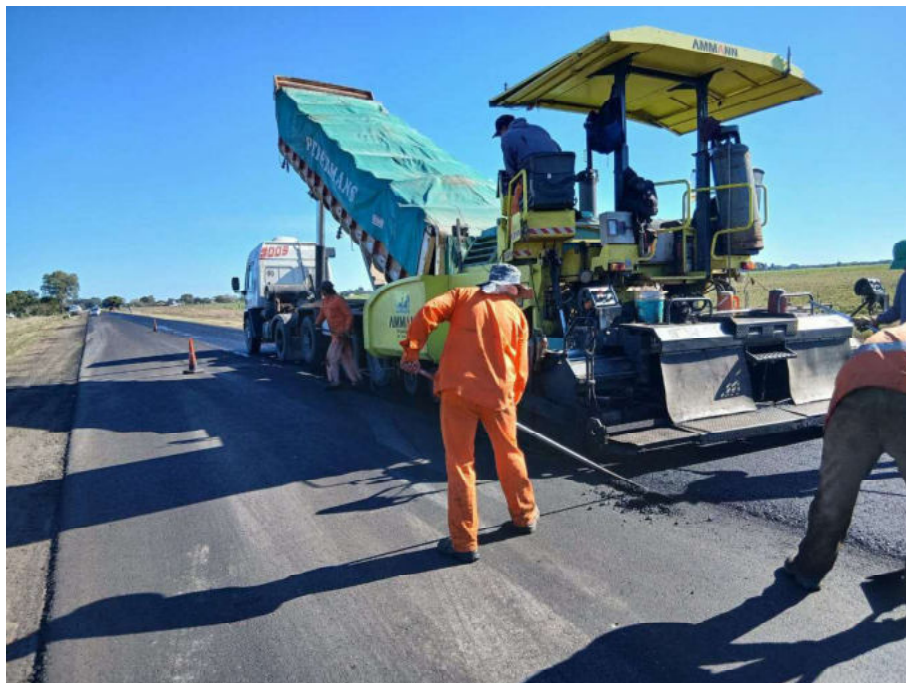

IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNY
Página 11 | 23



Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Martes, 12 de agosto de 2025

Carpeta asf. desde Km 915,315 a Km 915,150 LI.





Ministerio de Economía
Secretaría de Transporte

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Limpieza de basura entre Km 990,000 a Km 1000,000.



Acompaña Informes

Señor Juez Federal:

DANIEL R. ROMAGNOLI y SABRINA VIDONI, abogado, por la participación acreditada en estos autos caratulados “BENEFICIARIO: SCARPIN, DIONISIO FERNANDO Y OTRO s/ AMPARO” (FRE4885/2024), a V.S. dicen:

I.- Que vienen por el presente a cumplimentar con lo ordenado, acompañando a tal fin informe mensual correspondiente al mes de Agosto, obrante en los documentos NO-2025-98687758-APNDCHA#DNV e IF-2025-97744800-APN-DCHA#DNV, correspondientes al Distrito Chaco; en tanto que el informe obrante en documento NO-2025100055626-APN-DSF#DNV e IF-2025-100043969-APN-DSF#DNV, formulado por el Distrito Santa Fe.

II.- Por lo expuesto, solicitan se tengan presentes los informes acompañados para su agregación en autos.

Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.
